



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación
19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001
Url de validación
https://sede.aytozarza.com/validador
Metadatos
Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19464	53	36315	GT/1096	17/12/2018


ACTA DE RESULTADOS

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 14/12/2018 / 17/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)	RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDO EN:	Calicata

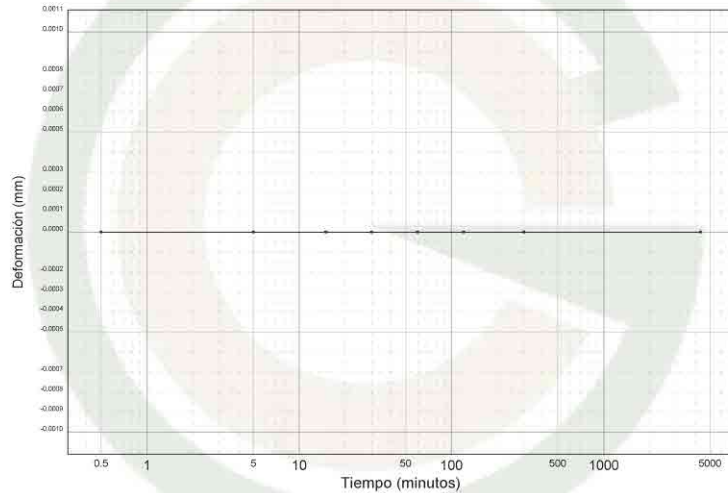

Página 2/2

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-22.081.706



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19465	54	36315	1096	17/12/2018

ACTAS DE RESULTADOS

OBRA:	Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado		
	Tarifa	Cádiz	
PETICIONARIO:	METROVACESA, S.A.		
Fecha Inicio de ensayo:	13/12/2018	Fecha Final de ensayo:	18/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
LOCALIZACIÓN:	Calicata C-7

METROVACESA, S.A.
Calle Quintanavides, número 13 - Parque Empresarial Via Norte
28050 Madrid

ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS (UU)



UNE 103401:1998

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
TOMADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE 103401/98)

	PASTILLA		
	1 Kp/cm ²	2 Kp/cm ²	3 Kp/cm ²
TENSIÓN NORMAL (Kp/cm ²):	1.02	2.04	3.06
TENSIÓN TANGENCIAL:	0.36	0.59	0.63
HUMEDAD INICIAL (%):	31.77	33.33	33.55
HUMEDAD FINAL (%):	31.66	31.78	31.64
VELOCIDAD (mm/mm.):	0.50	0.50	0.50
DIÁMETRO PASTILLA (mm):	50.00	50.00	50.00

TIPO DE ENSAYO: NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO



COHESIÓN (Kp/cm²):	0.25
ÁNGULO ROZAMIENTO (°):	7.80

Fdo.: Sergio Ramos Posada
Ldo. En Geología
Responsable de Ensayos Físicos

Fdo.: Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio





COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA ANUAL

ACTA OBRA

ALBARAN

MUESTRA

FECHA ACTA

2018/19466

55

36315

GT/1097

17/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado , Tarifa
PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018

IDENTIFICACION DE SUELOS:
GRANULOMETRIA DE SUELOS POR TAMIZADO,
DETERMINACION DE LOS LIMITES DE
ATTERBERG Y CLASIFICACION DE SUELOS
S/U.S.C.S. y AASHTO, s/norma UNE 103101:95;
UNE 103103/94; UNE 103104/93; ASTM D 2487-11

TIPO DE MUESTRA: Muestra Alterada

DESCRIPCIÓN: C-7 / M-3 (3,10 m)

PROCEDENCIA: Calicata C-7

COND. ATMOSFÉRICAS: Despejado

FECHA DE RECOGIDA: 27/11/2018

MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio


RECOGIDA EN: Calicata

LABORANTE: Francisco Oliva Villar

GRANULOMETRIA, LIMITES Y CLASIFICACION S/UNE 103101:95; UNE 103103/94; UNE 103104/93; ASTM D 2487-11

Tamiz (mm)	120	100	80	63	50	40	25	20	12,5	10	6,3	5	2	0,63	0,4	0,16	0,08
Pasa (%)	100	58	29	29	29	29	27	27	26	26	26	25	24	21	20	17	15,4

Curva granulométrica

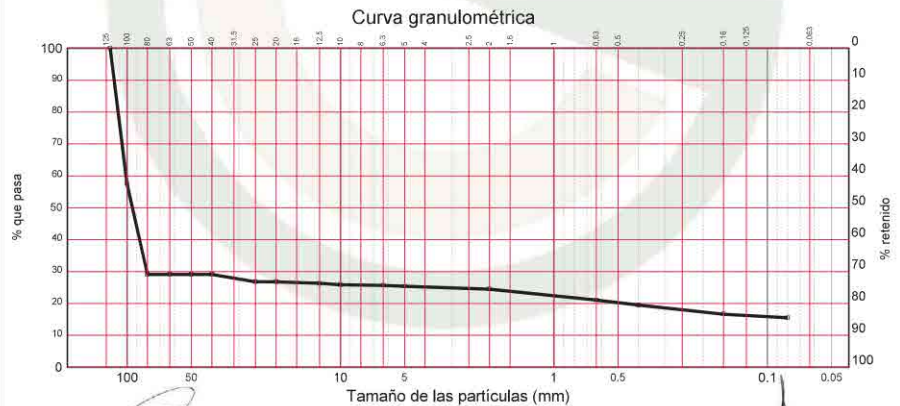

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Paz Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 C.I.F. B-72.081706

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 C.I.F. B-72.081706



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

OBRA: Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado , Tarifa
PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018

ACTA ANUAL

ACTA OBRA

ALBARAN

MUESTRA

FECHA ACTA

2018/19466

55

36315

GT/1097

17/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

TIPO DE MUESTRA: Muestra Alterada


DESCRIPCIÓN: C-7 / M-3 (3,10 m)

PROCEDENCIA: Calicata C-7

FECHA DE RECOGIDA: 27/11/2018

RECOGIDA POR: Muestreado por laboratorio

RECOGIDO EN: Calicata

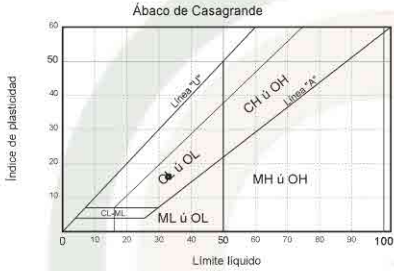

Clasificación AASHTO M145 (ASTM D3282)
Grupo: A-2-6 (0)
Materiales granulares. Grava y arena arcillosa o limosa

Tipo de suelo según PG-3
Suelo Adecuado

LIMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93

Limite líquido	32,9
Limite plástico	16,7
Índice de plasticidad	16,2

Clasificación USCS S/ASTM D2487
GC : Grava arcillosa

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Paz Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 C.I.F. B-72.081706

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 C.I.F. B-72.081706





ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 21/12/2018 / 21/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3.10 m)	MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDA EN:	Calicata
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado	LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

CONTENIDO DE YESO EN SUELOS S/NLT-115/99

CONTENIDO EN YESO	%	0,00
-------------------	---	------

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS S/UNE 103205:2006

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES	%	0,12
-----------------------------	---	------

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA S/UNE 103204:93; NLT-117; UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA	%	0,49
-------------------------------	---	------



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 10/12/2018 / 11/12/2018


TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3.10 m)	MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDA EN:	Calicata
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado	LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

PROCTOR NORMAL (UNE EN 103500/94)

Punto número	1	2	3	4
Humedad	4,2	8,0	14,0	18,3
Densidad	1,58	1,71	1,75	1,70
Densidad corregida				

Densidad máxima 1,75

Humedad óptima 13,4 %

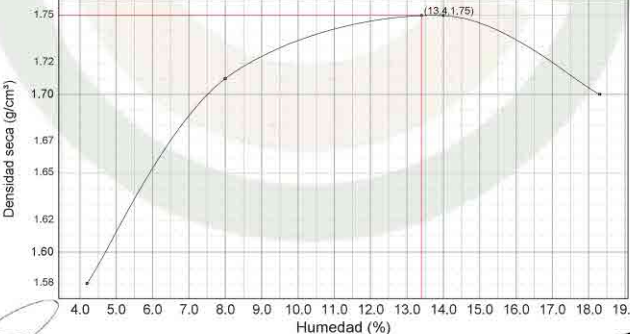



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbbbeae1fb36d0ad001

<https://sede.aytoarifa.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19470	59	36315	GT/1097	17/12/2018


ACTA DE RESULTADOS

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 14/12/2018 / 17/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)	RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDO EN:	Calicata

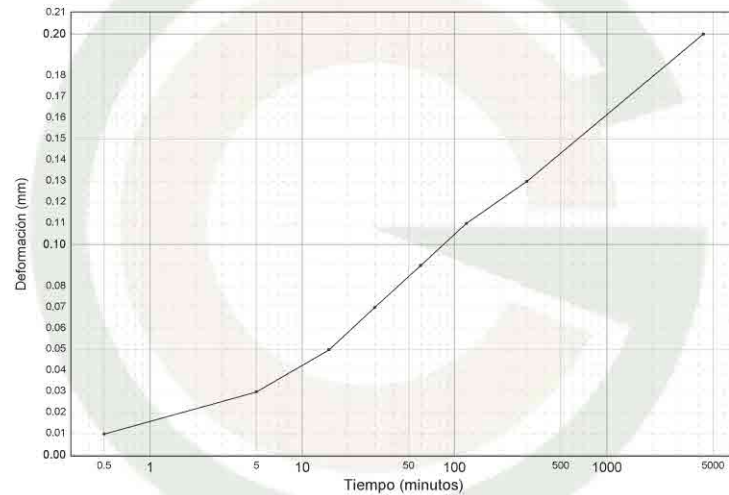

Página 2/2

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19471	60	36315	1097	17/12/2018

ACTAS DE RESULTADOS

OBRA:	Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado		
	Tarifa	Cádiz	
PETICIONARIO:	METROVACESA, S.A.		
Fecha Inicio de ensayo:	13/12/2018	Fecha Final de ensayo:	18/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)
LOCALIZACIÓN:	Calicata C-7

METROVACESA, S.A.

Calle Quintanavides, número 13 - Parque Empresarial Via Norte

28050

Madrid

Madrid

ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS (UU)



UNE 103401:1998

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
TOMADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE 103401/98)

	PASTILLA		
	1 Kp/cm ²	2 Kp/cm ²	3 Kp/cm ²
TENSIÓN NORMAL (Kp/cm ²):	1.02	2.04	3.06
TENSIÓN TANGENCIAL:	0.80	1.19	1.34
HUMEDAD INICIAL (%):	20.00	19.43	19.34
HUMEDAD FINAL (%):	23.52	20.85	20.85
VELOCIDAD (mm/mm.):	0.50	0.50	0.50
DIÁMETRO PASTILLA (mm):	50.00	50.00	50.00

TIPO DE ENSAYO: NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO



COHESIÓN (Kp/cm²):	0.57
ÁNGULO ROZAMIENTO (°):	14.70

Fdo.: Sergio Ramos Posada

Ldo. En Geología
Responsable de Ensayos Físicos

Fdo.: Juan Carlos Páez Hernández

Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmer" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19460	49	36315	GT/1096	17/12/2018

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018


IDENTIFICACION DE SUELOS: GRANULOMETRIA
DE SUELOS POR TAMIZADO, DETERMINACION
DE LOS LIMITES DE ATTERBERG Y
CLASIFICACION DE SUELOS S/U.S.C.S. y
AASHTO, s/norma UNE 103101:95; UNE 103103/94;
UNE 103104/93; ASTM D 2487-11

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
PROCEDENCIA:	Calicata C-7
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata
LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

GRANULOMETRIA, LIMITES Y CLASIFICACION S/UNE 103101:95; UNE 103103/94; UNE 103104/93; ASTM D 2487-11

Tamiz (mm)	100	80	63	50	40	25	20	12,5	10	6,3	5	2	0,63	0,4	0,16	0,08
Pasa (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	89	82	66	60,3

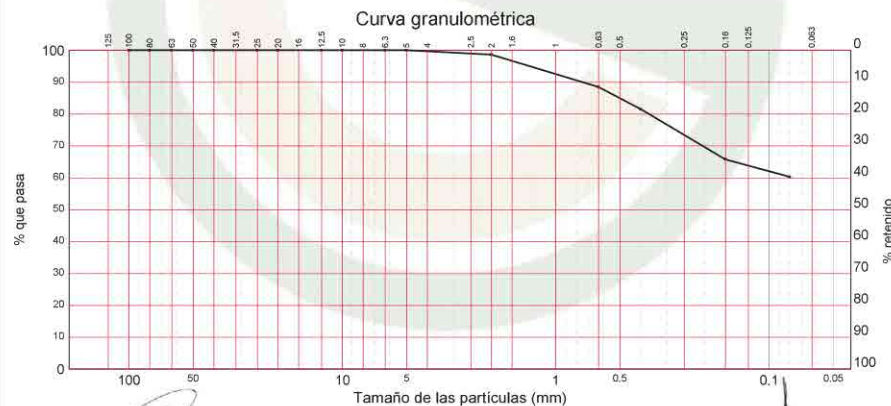

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmer" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.


Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19460	49	36315	GT/1096	17/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
PROCEDENCIA:	Calicata C-7

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDO EN:	Calicata

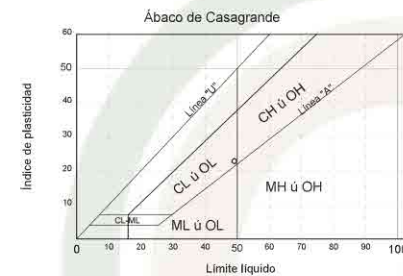

Tipo de suelo según PG-3

Tolerable

LIMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93

Limite líquido	49,1
Limite plástico	26,3
Índice de plasticidad	22,8

Clasificación USCS S/ASTM D2487

CL : Arcilla arenosa

Página 2/2

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil





Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbcbcae1fb36dad001

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19461	50	36315	GT/1096	17/12/2018

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 21/12/2018 / 21/12/2018

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS, s/norma UNE 103205:2006
CONTENIDO DE YESO EN SUELOS, s/norma NLT-115/99
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE EN SUELOS POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO, s/norma UNE 103204:93;
NLT-117; UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
PROCEDENCIA:	Calicata C-7
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata
LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS S/UNE 103205:2006

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES	%	0,02
-----------------------------	---	------

CONTENIDO DE YESO EN SUELOS S/NLT-115/99

CONTENIDO EN YESO	%	0,00
-------------------	---	------

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA S/UNE 103204:93; NLT-117; UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA	%	0,46
-------------------------------	---	------

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19462	51	36315	GT/1096	17/12/2018

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 10/12/2018 / 11/12/2018


ENSAYO DE COMPACTACION. PROCTOR NORMAL, s/norma UNE 103500:94, NLT-107

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
PROCEDENCIA:	Calicata C-7
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata
LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

PROCTOR NORMAL (UNE EN 103500/94)

Punto número	1	2	3	4
Humedad	10,2	15,8	20,4	25,4
Densidad	1,54	1,58	1,61	1,56
Densidad corregida				

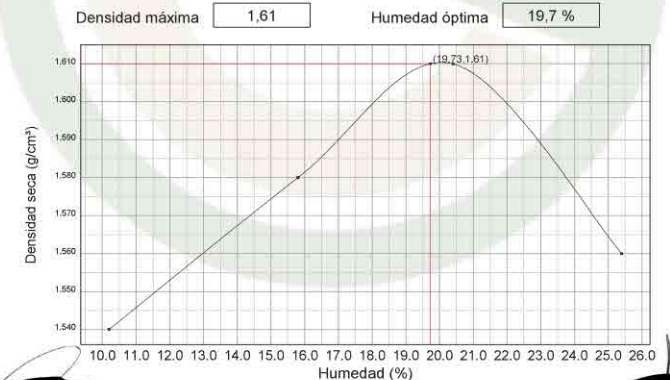

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

<https://sede.aytozarza.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19464	53	36315	GT/1096	17/12/2018


ACTA DE RESULTADOS

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 14/12/2018 / 17/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)	RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDO EN:	Calicata

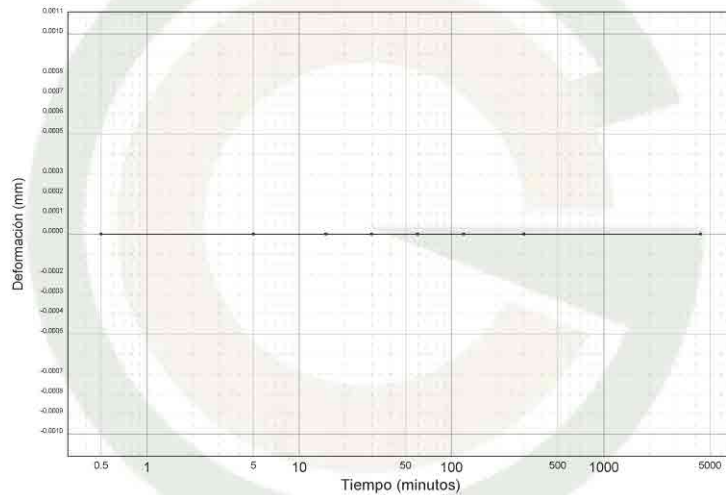

Página 2/2

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 6, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-22.081.706



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19465	54	36315	1096	17/12/2018

ACTAS DE RESULTADOS

OBRA:	Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado
	Tarifa Cádiz
PETICIONARIO:	METROVACESA, S.A.
Fecha Inicio de ensayo:	13/12/2018
Fecha Final de ensayo:	18/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-2 (2,0 m)
LOCALIZACIÓN:	Calicata C-7

METROVACESA, S.A.
Calle Quintanavides, número 13 - Parque Empresarial Via Norte
28050 Madrid

ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS (UU)



UNE 103401:1998

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
TOMADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE 103401/98)

	PASTILLA		
	1 Kp/cm ²	2 Kp/cm ²	3 Kp/cm ²
TENSIÓN NORMAL (Kp/cm ²):	1.02	2.04	3.06
TENSIÓN TANGENCIAL:	0.36	0.59	0.63
HUMEDAD INICIAL (%):	31.77	33.33	33.55
HUMEDAD FINAL (%):	31.66	31.78	31.64
VELOCIDAD (mm/mm.):	0.50	0.50	0.50
DIÁMETRO PASTILLA (mm):	50.00	50.00	50.00

TIPO DE ENSAYO: NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO



COHESIÓN (Kp/cm ²):	0.25
ÁNGULO ROZAMIENTO (°):	7.80

Fdo.: Sergio Ramos Posada
Ldo. En Geología
Responsable de Ensayos Físicos

Fdo.: Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio



LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.


Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)	MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDA EN:	Calicata
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado	LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

GRANULOMETRIA, LIMITES Y CLASIFICACION S/UNE 103101:95; UNE 103103/94; UNE 103104/93; ASTM D 2487-11

Tamiz (mm)	120	100	80	63	50	40	25	20	12,5	10	6,3	5	2	0,63	0,4	0,16	0,08
Pasa (%)	100	58	29	29	29	29	27	27	26	26	26	25	24	21	20	17	15,4

Curva granulométrica

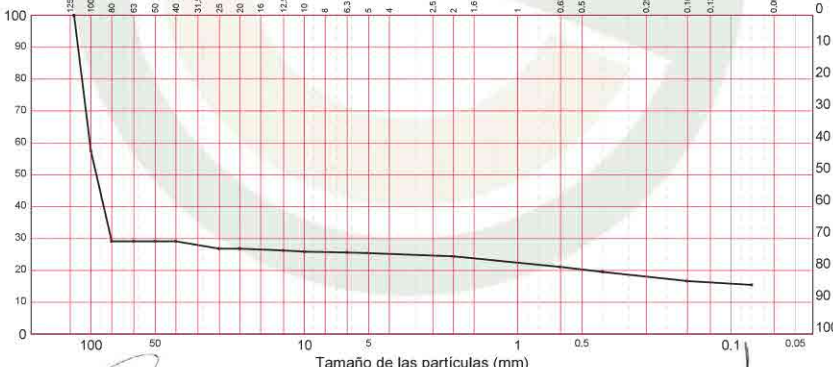

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

© LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad, Cádiz



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa


PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 03/12/2018 / 04/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)	RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDO EN:	Calicata

Ábaco de Casagrande



LIMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93

Límite líquido	32,9
Límite plástico	16,7
Índice de plasticidad	16,2

Clasificación USCS S/ASTM D2487

GC : Grava arcillosa

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

© LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad, Cádiz



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil

© LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad, Cádiz

Página 2/2





COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 21/12/2018 / 21/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3.10 m)	MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDA EN:	Calicata
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado	LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

CONTENIDO DE YESO EN SUELOS S/NLT-115/99

CONTENIDO EN YESO	%	0,00
-------------------	---	------

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS S/UNE 103205:2006

CONTENIDO EN SALES SOLUBLES	%	0,12
-----------------------------	---	------

DETERMINACION DEL CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA S/UNE 103204:93; NLT-117; UNE EN 1744-1 (Apdo. 14,2)

CONTENIDO EN MATERIA ORGÁNICA	%	0,49
-------------------------------	---	------



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1884, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

© LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

METROVACESA, S.A.
DELEGACION SEVILLA
C/Gerardo Diego 6E - Local
41013-Sevilla

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.
Inicio/Fin de ensayos: 10/12/2018 / 11/12/2018


TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3.10 m)	MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDA EN:	Calicata
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado	LABORANTE:	Francisco Oliva Villar

PROCTOR NORMAL (UNE EN 103500/94)

Punto número	1	2	3	4
Humedad	4,2	8,0	14,0	18,3
Densidad	1,58	1,71	1,75	1,70
Densidad corregida				

Densidad máxima 1,75

Humedad óptima 13,4 %

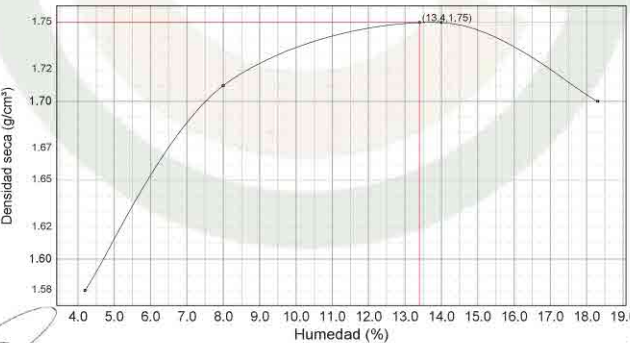


Densidad seca (g/cm³)

Humedad (%)



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1884, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

© LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil





Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19469	58	36315	GT/1097	17/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 13/12/2018 / 18/12/2018

INDICE C.B.R. EN EL LABORATORIO, s/norma UNE EN 103502:1995 / NLT-111

FECHA DE RECOGIDA: 27/11/2018

MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio

RECOGIDO EN: Calicata

INDICE CBR EN EL LABORATORIO S/UNE EN 103502:1995 / NLT-111			
	MOLDE A	MOLDE B	MOLDE C
Energía compactación	25% (15 golpes)	50% (30 golpes)	100% (60 golpes)
Densidad	1,620 g/cm³	1,700 g/cm³	1,760 g/cm³
Humedad	14,5 %	16,2 %	15,5 %
Absorción	7,12 %	5,58 %	3,38 %
Hinchamiento (5 días)	0,52 %	0,84 %	1,48 %
Índice C.B.R.	1	2	3

Norma: UNE 103.502-1995 Material retenido tamiz 20 mm.: 73,00 % Sobrecarga utilizada: 7,9 kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

Gráfica Índice CBR/Densidad (g/cm³)

Proctor Normal

Densidad máxima	1,750 g/cm³
Humedad óptima	13,4 %
Compactación (100 %)	1,750 g/cm³

Compactación	Densidad	Índice CBR
95 %	1,663 g/cm³	2
98 %	1,715 g/cm³	2
100 %	1,750 g/cm³	2

Índice CBR (100 %)	2 %
Hinchamiento (100 %)	1,36 %
Absorción (100 %)	3,78 %
Humedad (100 %)	15,4 %

520 10 520 875



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19470	59	36315	GT/1097	17/12/2018

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 8139 - s/Rfa.: Pedido 4500195900
OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 14/12/2018 / 17/12/2018

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO, s/norma UNE 103601-96

FECHA DE RECOGIDA: 27/11/2018

MUESTREADA POR: Muestreado por laboratorio

RECOGIDA EN: Calicata

LABORANTE: Francisco Oliva Villar

Ensayo GTL-0013 - ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE EN EDÓMETRO S/UNE 103601-96											
DIMENSIONES DE LA PROBETA											
Diámetro	cm	5									
Altura	cm	2,0									
Area	cm²	19,63									
Volumen	cm³	39,27									
PARAMETROS FISICOS											
Densidad húmeda aparente inicial	gr/cm³	2,50									
Densidad húmeda aparente final	gr/cm³	2,15									
Densidad seca inicial	gr/cm³	1,68									
Densidad relativa de las partículas	gr/cm³	2,635									
Humedad inicial	%	48,64									
Humedad final	%	28,18									
LECTURAS HINCHAMIENTO LIBRE											
Presión	Kp/cm²	0,10									
Tiempo (minutos)		0	0,5	5	15	30	60	120	300	4320	
Lectura Final de Carga	mm	5	5,012	5,032	5,051	5,068	5,089	5,112	5,135	5,201	
Deformación acumulada	mm	0,00	0,01	0,03	0,05	0,07	0,09	0,11	0,13	0,20	
Hinchamiento libre	%	1,00									



Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos



Juan Carlos Pérez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 6, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081.706

© LABORATORIOS COGESUR, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, Cádiz



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbdbeae1fb36d0ad001

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

<https://sede.aytoarifa.com/validador>



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19470	59	36315	GT/1097	17/12/2018


ACTA DE RESULTADOS

OBRA: Edificios de viviendas
Sector SUS-TA-02, Albacerrado, Tarifa

PETICIONARIO: METROVACESA, S.A.

Inicio/Fin de ensayos: 14/12/2018 / 17/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada	FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)	RECOGIDA POR:	Muestreado por laboratorio
PROCEDENCIA:	Calicata C-7	RECOGIDO EN:	Calicata

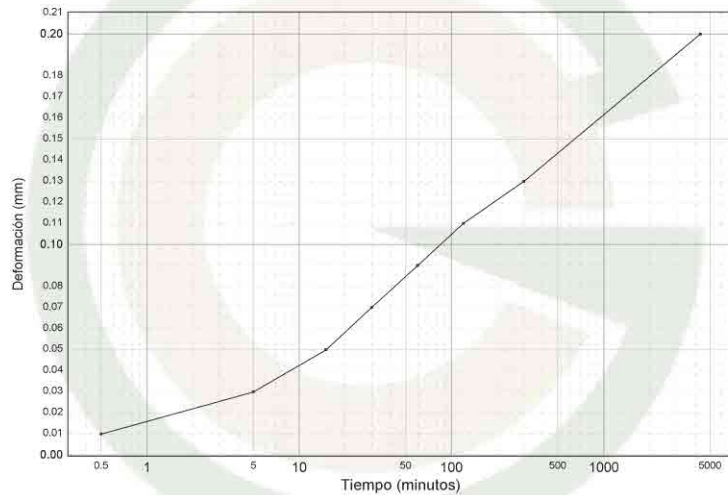

Página 2/2

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1881, Libro 6, Folio 28, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-22.081.706



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/19471	60	36315	1097	17/12/2018

ACTAS DE RESULTADOS

OBRA:	Urbanización Sector SUS-TA-02, Albacerrado		
	Tarifa	Cádiz	
PETICIONARIO:	METROVACESA, S.A.		
Fecha Inicio de ensayo:	13/12/2018	Fecha Final de ensayo:	18/12/2018

TIPO DE MUESTRA:	Muestra Alterada
DESCRIPCIÓN:	C-7 / M-3 (3,10 m)
LOCALIZACIÓN:	Calicata C-7

METROVACESA, S.A.
Calle Quintanavides, número 13 - Parque Empresarial Via Norte
28050 Madrid

ENSAYO DE CORTE DIRECTO DE SUELOS (UU)



UNE 103401:1998

FECHA DE RECOGIDA:	27/11/2018
TOMADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Calicata

ENSAYO DE CORTE DIRECTO (UNE 103401/98)

	PASTILLA		
	1 Kp/cm ²	2 Kp/cm ²	3 Kp/cm ²
TENSIÓN NORMAL (Kp/cm ²):	1.02	2.04	3.06
TENSIÓN TANGENCIAL:	0.80	1.19	1.34
HUMEDAD INICIAL (%):	20.00	19.43	19.34
HUMEDAD FINAL (%):	23.52	20.85	20.85
VELOCIDAD (mm/mm.):	0.50	0.50	0.50
DIÁMETRO PASTILLA (mm):	50.00	50.00	50.00

TIPO DE ENSAYO: NO CONSOLIDADO Y NO DRENADO



COHESIÓN (Kp/cm²):	0.57
ÁNGULO ROZAMIENTO (°):	14.70

Fdo.: Sergio Ramos Posada
Ldo. En Geología
Responsable de Ensayos Físicos

Fdo.: Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

<https://sede.aytoarria.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



COGESUR
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmer" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ANEXO Nº4: COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS DE SONDEOS Y CALICATAS.

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 28, Hoja CA-35478, C.I.F.: B-72.081.706



EXPEDIENTE Nº8139



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

PROYECTO: METROVAGESA, S.A.		Lugar: SECTOR SUS-TADZ, ALBACERRADO, TARIFA (CÁDIZ)		Fecha: 03/11/2016		Estado: SR-1								
EXEQUENTE: 1109		Interventores en el sondeo: 15.0 m de tubería piezométrica		Nivel piezométrico: -1.25 m		Observaciones: Se toma muestra del tubo piezométrico para analizar en Laboratorio.								
Profundidad (m)	Cota (m)	Profundidad (m)	Espesor capa (m)	Columna estratigráfica	Niveles Geotécnicos	Descripción	% Testigo recuperado		Tipo de Muestras	Código SPT / NAL	Clasificación del suelo			FOTOS CAJAS PORTA MUESTRAS
							cm	mm			USCS	AASHTO	I.C.	
0.0			1.00		SUELO ANTROPORIZADO	Suelo antropizado constituido por arena de fundición maciza con abundantes restos de metal y grava pulgérica centralizada.								
1.0	1.00													
2.0										2.00				
2.6										56-2.7	CL	A-7-6	10	
2.60														
4.0										4.00				
5.0										50-5.1	CL	A-8	10	
6.0										6.00				
7.0										7-10-15-31	CL	A-7-6	10	
8.0										8.00				
8.0					ARCILLAS ROJAS Y ARENISCAS MICÁCEAS	Secuencia de materiales cohesivos formada por unas arcillas arenosas de media plasticidad de tonalidades marrones oscuras, algo rojizas, con cierta cantidad de grava más abundante a fondo del estrato. De 3.00 m 5.00 m presenta una baja consistencia. Conforme aumenta la profundidad se observa fractura concéntrica y brillo ceroso.				25-8.0R				
8.0														
10.0										10.00				
10.0										25-10.0R				
11.0										11.00				
12.0										12.00				
12.0										25-12.0R				
13.0										13.00				
14.0														
15.0										15.00				
15.0										25-15.0R				
15.0										15.00				

MAQUINARIA: ROLATEC RL-36

Sondista: Francisco Oliva Villar

Revisado por: Sergio Ramos Posada



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

19cb030b1995417bbcbcae1fb36cd0ad001

<https://sede.aytofarfia.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

PESQUERA S.A.		SECTOR SUS-TA-02 ALBACERADO, TARRA (CÁDIZ)		20-00110216		SR-2	
PROYECTO		RECONSTRUCCIÓN DEL BULVARO		NIVEL PRELIMINAR		OBSERVACIONES	
ESTR		15.0 m de tubería pasaducto					
Profundidad (m)	Caliz (m)	Profundidad (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)
0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

MACQUARRA, ROTATED RL-06

Sonido: Francisco Oliva Villar

Revisado por: Sergio Ramos Posada




COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

PESQUERA S.A.		SECTOR SUS-TA-02 ALBACERADO, TARRA (CÁDIZ)		20-00110216		SR-3	
PROYECTO		RECONSTRUCCIÓN DEL BULVARO		NIVEL PRELIMINAR		OBSERVACIONES	
ESTR		15.0 m de tubería pasaducto					
Profundidad (m)	Caliz (m)	Profundidad (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)	Espejo (m)
0.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
7.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
8.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
9.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
11.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
12.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
13.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
14.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
15.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
16.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
17.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
18.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
19.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
20.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

MACQUARRA, ROTATED RL-06

Sonido: Francisco Oliva Villar

Revisado por: Sergio Ramos Posada





Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación
Url de validación
Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

METROVACESA, S.A.		SECTOR SUS-TA-42 ALBACERADO, TARRA (CÁND)		SR-4	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139		20110218	
PROYECTO		OBJETIVO		FECHA	
1139		1139			



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz
Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

<https://sede.aytoiafia.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

METROKES S.A.		SECTOR SUB-TAGE ALMACENADO TAMPA CADE		SR-6	
1336		MUEL PRELADO		SONDA CADE	
Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)
1.00	1.00	1.70	2.70	12.30	15.00
Niveles Geotécnicos		Descripción		FOTOS CAJAS PORTA MUESTRAS	
SUELO DE RECUBRIMIENTO		Nivel compuesto por unas arcillas marrones oscuras, pasando a verdosa en profundidad con vestigios fibrilares de roca a indicio de material de origen antropico.			
ARCILLAS ROJAS		Arcillas margosa marrón oscura, tornándose a verdosa y roja en profundidad. Presenta restos fibrilares de raiceros, más frecuentes a techo.			
CALIZAS BIOCLÁSTICAS		Roca de tonalidad grisácea.			

MAQUINARIA: ROTATEC RL-26

Sondata: Francisco Oliva Villar

Revisado por: Sergio Ramos Pineda



COLUMNA ESTRATIGRÁFICA DE SONDEO A ROTACIÓN
(XP P94-202 / ASTM D-1587-00 / ASTM D-2113-82)

METROKES S.A.		SECTOR SUB-TAGE ALMACENADO TAMPA CADE		SR-7	
1336		MUEL PRELADO		SONDA CADE	
Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)	Profundidad (m)
0.92	0.92	1.45	1.45	1.45	1.45
Niveles Geotécnicos		Descripción		FOTOS CAJAS PORTA MUESTRAS	
SUELO DE RECUBRIMIENTO		Nivel compuesto por unas arcillas marrones oscuras, pasando a verdosa en profundidad con vestigios fibrilares de roca a indicio de material de origen antropico.			
ARCILLAS Y MARGAS		Secuencia de arcillas margosas de tonalidades claras, que se tornan a tonos grisáceos oscuros en profundidad.			
					
					
					

MAQUINARIA: ROTATEC RL-26

Sondata: Francisco Oliva Villar

Revisado por: Sergio Ramos Pineda

		
Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:	
Código Seguro de Validación	f9cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001
Url de validación	https://sede.aytoarria.com/validador
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



 www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es

 Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730

 P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478, C.I.F.: B-72.081.706

ANEXO Nº5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478, C.I.F.: B-72.081.706



 www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es

 Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730

 P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



PARCELA OBJETO DE ESTUDIO



Firma 1 de 1		
	Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024 SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:	Código Seguro de Validación
	Url de validación
Metadatos	19cb030b1995417bbcbcae1fb36cdad001
	https://sede.aytoalcala.com/validador
Origen: Origen administración	Estado de elaboración: Original



 www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es

 Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730

 P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



Sondeo SR-1



Sondeo SR-2

EXPEDIENTE Nº8139



 www.cogesur.es
E-mail: coesur@coesur.es

 Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730

 P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



Sondeo SR-3



Sondeo SR-4

EXPEDIENTE Nº8139



Firma 1 de 1		
	Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024 SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:	Código Seguro de Validación
	Url de validación
	Metadatos
	19cb030b1995417bbcbcae1fb36cdad001
	https://sede.aytoarria.com/validador
	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



Sondeo SR-5



Sondeo SR-6

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478, C.I.F.: B-72.081.706

EXPEDIENTE Nº8139



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es
Telfs.: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730
P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



Sondeo SR-7

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478, C.I.F.: B-72.081.706

EXPEDIENTE Nº8139



Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz
Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.

Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

19cb030b1995417bbcbcae11b36cdad001

<https://sede.aytoalcala.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es



Teléfono: 956 861 729 - 956 856 895
Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" - C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)



Ensayo penetrométrico P-1



Ensayo penetrométrico P-2



Ensayo penetrométrico P-3

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPS

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478, C.I.F. B-72.081.706



ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008



Polígono Ind. El Palmar, C/Forja, nº 21.
11500 - El Puerto de Sta. María (Cádiz)

TLF: 956 861 729 / FAX: 956 861 730

mail: cogesur@cogesur.es

WEB: www.cogesur.es

EXPEDIENTE N°8139



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

metrovacesa

Proyecto de Urbanización del Sector SUS-TA-02 "Albacerrado"

Tarifa, Cádiz

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

f9cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

<https://sede.aytoaria.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



(IA)
FACTOR(IA)

ANEJO 5. MOVIMIENTO DE TIERRAS



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

metrovacesa

Proyecto de Urbanización del Sector SUS-TA-02 "Albacerrado"

Tarifa, Cádiz

INDICE

- 5.1. INTRODUCCIÓN
- 5.2. LISTADOS DE MEDICIONES AUXILIARES



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación

Url de validación

Metadatos

19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

<https://sede.ayto-tarifa.com/validador>

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

metrovacesa

Proyecto de Urbanización del Sector SUS-TA-02 "Albacerrado"

Tarifa, Cádiz

5.1. INTRODUCCIÓN.

En el presente documento se recoge el movimiento de tierras correspondiente a las obras del proyecto de Urbanización del Sector SUS-TA-02 "Albacerrado"

El movimiento de tierras se ha obtenido a partir de los perfiles transversales que proporciona la cartografía a escala 1/1.000 elaborada expresamente para este proyecto.

Taludes adoptados

Para los rellenos se han adoptado de forma genérica taludes 2H:1V y para los desmontes se adoptan taludes 1H:1V.

Clasificación de los materiales extraídos

El total del volumen de material procedente de la excavación no es aprovechable, por lo que se deberá retirar a vertedero.

En el presente proyecto se ha considerado la necesidad de traer de canteras, graveras y préstamos todos los materiales necesarios para la explanación de los viales.

Espesor de tierra vegetal

En el presente Proyecto no se ha considerado un espesor concreto de tierra vegetal ya que todos los materiales sobre los que apoyan los viales se excavan y retiran a vertedero o a zonas ajardinadas. Todos los viales proyectados son saneada un metro por debajo de la rasante actual.

(IA)

FACTOR(IA)

Factor-ia Arquitectura y Urbanismo S.L.P

Tlf./Fax: 954 03 33 61

factor-ia@factor-ia.com



Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

<https://sede.ayto-tarifa.com/validador/f9cb030b1995417bbcbcae1fb36cd0ad001>

Firma 1 de 1

Francisco Antonio Ruiz Romero

05/08/2024

SECRETARIO GENERAL
ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.-
Admitido a trámite por Decreto
de la Alcaldía de fecha
02.08.2024.



5.2. LISTADO DE MEDICIONES AUXILIARES

A continuación se adjuntan las tablas con las mediciones auxiliares de los viales del proyecto, para su cálculo se ha utilizado un programa de diseño de viales y explanaciones.

Señalar que en estas mediciones auxiliares se contabiliza el desmonte y el saneado del terreno realizados. El terraplen que se indica sólo es desde la base el cimiento del firme (ya con el saneo realizado), hasta la capa de asiento.

VIAL A

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
0.000	6.398	0.864	20.957	0.000	0.000	0.000
				35.313	3.906	94.251
4.483	9.357	0.878	21.091	35.313	3.906	94.251
				4.943	0.404	10.910
5.000	9.765	0.684	21.112	40.256	4.309	105.161
				61.938	2.954	105.975
10.000	15.010	0.498	21.278	102.194	7.263	211.136
				96.507	2.525	109.093
15.000	23.592	0.512	22.360	198.701	9.788	320.228
				149.515	2.554	114.707
20.000	36.214	0.509	23.523	348.216	12.343	434.935
				207.783	2.667	120.902
25.000	46.899	0.558	24.837	555.999	15.010	555.837
				231.885	2.726	121.853
29.821	49.298	0.573	25.714	787.884	17.736	677.690
				8.823	0.103	4.604
30.000	49.282	0.573	25.725	796.707	17.838	682.294
				247.821	2.891	128.812
35.000	49.846	0.583	25.800	1044.527	20.729	811.106
				251.563	2.938	129.006
40.000	50.780	0.592	25.802	1296.090	23.667	940.113
				260.591	2.874	129.060

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
45.000	53.457	0.558	25.822	1556.681	26.541	1069.173
				282.104	2.790	129.538
50.000	59.385	0.559	25.993	1838.785	29.332	1198.711
				301.670	2.866	130.500
55.000	61.283	0.588	26.207	2140.455	32.198	1329.211
				317.706	2.885	133.298
60.000	65.799	0.566	27.113	2458.161	35.082	1462.509
				332.756	2.777	135.422
65.000	67.303	0.545	27.056	2790.916	37.859	1597.931
				327.672	2.715	134.111
70.000	63.765	0.541	26.588	3118.588	40.574	1732.042
				310.500	2.704	131.862
75.000	60.435	0.540	26.156	3429.088	43.278	1863.904
				302.204	2.783	130.311
80.000	60.447	0.573	25.968	3731.292	46.062	1994.214
				334.729	2.843	131.011
85.000	73.445	0.564	26.437	4066.021	48.905	2125.226
				421.185	2.636	132.858
90.000	95.029	0.490	26.707	4487.206	51.541	2258.084
				463.833	2.531	132.856
95.000	90.504	0.523	26.436	4951.039	54.072	2390.940
				448.281	2.602	131.550
100.000	88.809	0.518	26.184	5399.320	56.674	2522.490
				443.559	2.838	131.121
105.000	88.615	0.617	26.264	5842.879	59.513	2653.611
				422.497	2.839	131.247
110.000	80.384	0.518	26.235	6265.375	62.352	2784.858
				361.790	2.784	130.872
115.000	64.332	0.595	26.114	6627.166	65.136	2915.730
				304.333	3.032	129.477
120.000	57.401	0.618	25.677	6931.499	68.168	3045.207
				282.177	3.049	127.808
125.000	55.470	0.602	25.446	7213.676	71.217	3173.015
				279.498	2.993	126.577
130.000	56.329	0.595	25.185	7493.173	74.210	3299.592
				285.138	2.968	125.770
135.000	57.726	0.592	25.124	7778.311	77.178	3425.362



Metadatos

Url de validación

Código Seguro de Validación

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

https://sede.ayto-tarifa.com/validador

19cb030b1995417bbcbcae1fb36d0ad001

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Factor-ia

(IA)

FACTOR(IA)



Firma 1 de 1		
Francisco Antonio Ruiz Romero	05/08/2024	SECRETARIO GENERAL ACCIDENTAL.- DILIGENCIA.- Admitido a trámite por Decreto de la Alcaldía de fecha 02.08.2024.

P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
				8.010	1.658	60.096
315.000	3.081	0.575	21.596	11115.500	581.726	7449.769
				18.089	2.759	108.170
320.000	4.154	0.528	21.672	11133.590	584.485	7557.939
				22.186	2.629	108.829
325.000	4.720	0.523	21.859	11155.776	587.114	7666.768
				7.793	0.944	39.187
326.790	3.988	0.531	21.925	11163.569	588.057	7705.955

TOTALES	
Volumen de Desmonte	11163.569
Volumen de Terraplén	588.057
Volumen de Vegetal	7705.955
Superficie Desbroce	7705.955

VIAL B1						
P.K.	Sup.Des.	Sup.Ter.	Sup.Veg.	Vol.Des.	Vol.Ter.	Vol.Veg.
0.000	0.487	1.314	14.807	0.000	0.000	0.000
				10.499	5.767	73.732
5.000	3.713	0.993	14.685	10.499	5.767	73.732
				22.371	5.287	75.041
10.000	5.235	1.121	15.331	32.870	11.054	148.773
				22.582	5.320	74.958
15.000	3.798	1.007	14.652	55.452	16.374	223.730
				16.519	4.994	72.635
20.000	2.810	0.991	14.402	71.971	21.368	296.365
				8.843	5.887	70.996
25.000	0.727	1.364	13.997	80.814	27.256	367.362
				1.819	14.324	68.784
30.000	0.000	4.366	13.517	82.633	41.579	436.146
				0.000	29.565	65.819
35.000	0.000	7.460	12.811	82.633	71.144	501.965
				0.139	41.427	68.093
40.000	0.056	9.110	14.427	82.772	112.571	570.058
				25.909	41.855	81.321
45.000	10.308	7.632	18.102	108.680	154.427	651.379
				112.558	22.107	89.619
50.000	34.715	1.211	17.746	221.238	176.534	740.999
				204.230	5.095	89.918
55.000	46.977	0.827	18.221	425.469	181.629	830.917
				227.292	4.120	90.772
60.000	43.940	0.821	18.088	652.760	185.749	921.689
				214.810	4.125	90.813
65.000	41.985	0.829	18.238	867.571	189.873	1012.502
				192.039	4.313	89.025
70.000	34.831	0.897	17.372	1059.610	194.187	1101.528
				168.194	4.444	86.500
75.000	32.446	0.881	17.228	1227.803	198.631	1188.027
				168.222	4.288	86.757
80.000	34.842	0.834	17.475	1396.025	202.918	1274.784
				172.892	4.143	87.693

